


GOVERNMENT OF JHARKHAND

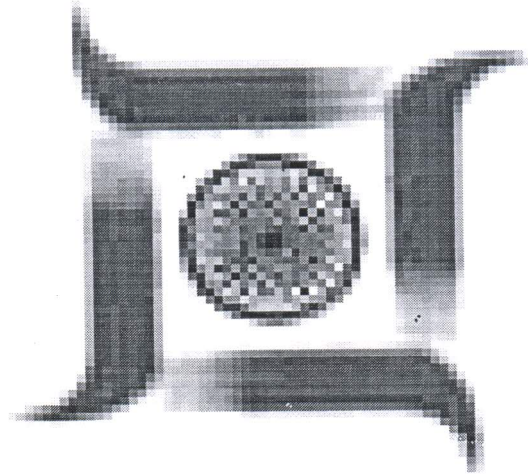

**ROAD CONSTRUCTION DEPARTMENT
(NATIONAL HIGHWAY WING)
JHARKHAND, RANCHI**

N.H. NO. : 75(E)
N.H. DIVISION : CHAIBASA
N.H. CIRCLE : RANCHI

Subject : Progress Report Ending March - 2011

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय

राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, चाईबासा

योजना (पथ) I.R.Q.P.

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं तिथि (लाख)	एकरारनामा की राशि (लाख)	कार्यादेश की तिथि कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि	वर्ष 2009-10 तक व्यय (लाख)	पिछले माह तक व्यय (लाख)	इस माह में व्यय (लाख)	कुल व्यय (लाख)	प्राप्त आवंटन (लाख)	वर्क प्लान के अनुसार अब तक कितना व्यय होना था (लाख)	वर्क प्लान के अनुसार अगर प्रगति नहीं हुई तो की गई कार्रवाई	अभ्युक्ति
					All expenditure inclusive of 9% agency charge							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I.R.Q.P. work in km 130 to 142 of NH - 75E	538.27 30/10/07 Revised 663.50 25/08/09	578.86	22/10/09 21/04/2010	33.09	404.49	103.73	508.22	DPP	578.86x1.09 = 630.95	Notice issued vide TO.Lt No. 748 Dt 22.10.09 Lt No. 874 Dt 10.12.09, Lt No. 30 Dt 15.01.10, Lt No. 143 Dt 18.02.10, Lt No. 257 Dt 25.03.10, Lt No. 323 Dt 20.04.10, Lt No. 355 Dt 29.04.10. Lt No. 426 Dt. 29.05.10, Lt. No. 549 Dt. 09.07.10, Lt. No. 658 Dt. 26.08.10, Lt. No. 687 Dt. 01.09.10	BUSG - 13 Km BM.-13 Km S.D.B.C -5.0 Km

कार्यपालक अभियन्ता,
रा० उ० पथ प्रमंडल, चाईबासा।

Law
1/4/11


1/4

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय

राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, चाईबासा

योजना (पथ) Widening & Strengthening

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं तिथि (लाख)	एकरारनामा की राशि (लाख)	कार्यादेश की तिथि कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि	वर्ष 2009-10 तक व्यय (लाख)	पिछले माह तक व्यय (लाख)	इस माह में व्यय (लाख)	कुल व्यय (लाख)	प्राप्त आवंटन (लाख)	वर्क प्लान के अनुसार अब तक कितना व्यय होना था (लाख)	वर्क प्लान के अनुसार अगर प्रगति नहीं हुई तो की गई कार्रवाई	अभ्युक्ति
					All expenditure inclusive of 9% agency charge							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Widening & Strengthening in km 117 to 129 of NH - 75E	1918.66 14.01.09 Revised 2058.05 23.08.10	1783.94	03.06.10 02.07.11	-	530.29	165.54	695.83	D.P.P	1495.76	-	Work in 9 Nos completed upto Deck slab (Fullwidth) and Half width upto Deck slab in 6 Nos. Drain -700m completed. Guard wall 278m, GSB. Gr I- 12km. GSB. Gr II - 12 Km Completed WMM 6Km. Exp includes (1) Mob. Adv. - 194.44 lacs (ii) To Elect. Dept.- 12.99 lacs (iii) Price Adj.- 4.85 lacs
2	Widening & Strengthening in km 177 to 189 of NH - 75E	2780.97 14.01.09	2244.48	28.08.09 27/09/10	1378.6	2394.44	245.44	2639.88	D.P.P	2244.48 x 1.09 = 2446.48	-	Work Completed. Exp. Done for Price Adj. - 245.44 lacs
3	Widening & Strengthening in km 190 to 202 of NH - 75E	3148.45 14.01.09	2582.19	10.09.09 09/10/10	1764.41	2799.31	0.00	2799.31	D.P.P	2582.19 x 1.09 = 2814.59	-	Work Completed.
			6610.61	Total	3143.01	5724.04	410.98	6135.02				


 कार्यपालक अभियन्ता,
 रा० उ० पथ प्रमंडल, चाईबासा।

1/4

राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, चाईबासा

योजना (पथ) Widening & Strengthening (L.W.E)												
क्र० सं०	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं तिथि (लाख)	एकरारनामा की राशि (लाख)	कार्यादेश की तिथि — कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि	वर्ष 2009-10 तक व्यय (लाख)	पिछले माह तक व्यय (लाख)	इस माह में व्यय (लाख)	कुल व्यय (लाख)	प्राप्त आवंटन (लाख)	वर्क प्लान के अनुसार अब तक कितना व्यय होना था (लाख)	वर्क प्लान के अनुसार अगर प्रगति नहीं हुई तो की गई कार्रवाई	अभ्युक्ति
					All expenditure inclusive of 9% agency charge							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Widening to 2-lane & improvement in Km 62 to 116 of N.H 75(E)	8015.40 31.03.10 Revised 9360.29 30.08.10	7803.51	21.09.10 20/03/12	0	1023.54	0.00	1023.54	D.P.P	2835.30	Notice issued vide T.O. Lt. No. 779 Dt. 28.09.10, Lt. No. 857 Dt. 23.10.10, Lt. No. 882 Dt. 28.10.10 & Lt. No. 922 Dt. 19.11.10	Work in Progress in 13 No. culverts. Box cutting done in 4.5 Km one side. Exp. Includes (i) Mob. Adv. - 850.58 lacs (ii) DWSD Deptt. - 126.36 lacs (iii) Elect. Deptt. - 46.60 lacs
2	Widening to 2-lane & improvement in Km 143 to 176 of N.H 75(E)	4781.13 31.03.10 Revised 5397.44 10.11.10	4693.80	10.12.10 09.03.12	0	767.44	530.97	1298.41	D.P.P	1023.24		work in progress in 10Nos. Culvert. GSB Gr II (1st and 2nd layer) both side - 13 Km. Shoulder - Both side - 13 Km. Exp. includes (i) Mob. adv. and equipe adv. - Rs. 767.44 lacs (ii) Price Adj. - Rs. 21.04 lacs
			12497.31	Total	0	1790.98	530.97	2321.95				

कार्यपालक अभियन्ता,
रा० उ० पथ प्रमण्डल, चाईबासा।

6/14

